# Projektliste Runder Tisch (18.07.2019)

Stand: 22.07.2019

### 1. Abgeschlossene (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte		
1	Mensa-Öffnung mit Versorgungsau -> Kick-off	tomaten; Chiporello	
1.1	Strom- und WLAN-Versorgung verbessern		<ul><li>Versorgung mit 15 zusätzlichen Steckdosen ist erledigt.</li><li>WLAN-Ausbau: abgeschlossen</li></ul>
1.2	Serviceverbesserung + Versorgungsautomaten		<ul> <li>Öffnungszeiten: wie Gebäudeöffnungszeiten</li> <li>samstags ab 8.30 Uhr Service Serviceautomaten sind aufgestellt. Das Angebot wird gut angenommen</li> <li>Lüftungssystem (strenger Geruch): It. beauftragter Firma Abluftproblem, Abhilfe Luftleitbleche und Abluftmotor, abgeschlossen</li> <li>Ab 6. Mai: Neuer Küchenleiter in der Mensa</li> <li>Die Renovierung + Neubestuhlung der Mensa wird nun durchgeführt:</li></ul>

# (Teil)Projekte Schwarzes Loch inkl. Bibliothekseingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen -> Kick-off Umsetzung bis auf Austausch der Deckenplatten und -Neugestaltung Eingangsbereich vorher: Bibliothek beleuchtung abgeschlossen. Gewünschte Ergänzung Stromanschlüsse für die Sitzecke (Studierendenwunsch): wird geprüft Lichtstärkeprüfung für neu geplante Beleuchtung: 300-500 Lux nachher: **Bibliothek** Druckerei

Nr	(Teil)Projekte		
2.3	Bibliothek: Zugang zu den Lernräumen	<ul> <li>außerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten</li> </ul>	<ul> <li>Die Testphase wurde zum 31.01.2019 eingestellt, da die Studierendenresonanz außerhalb der Klausurvorbereitungszeiten sehr gering war.</li> <li>Es gibt Überlegungen, die Öffnungszeiten in der Klausurvorbereitungsphase ggf. wieder auszuweiten.</li> <li>Ergänzung</li> <li>Die Öffnungszeiten der Fachbibliothek Hagen sollen wie folgt verlängert werden (Klausurvorbereitungsphase):         <ul> <li>17.6 18.7.2019</li> <li>Mo - Fr: bis 19 Uhr, Sa bis 16 Uhr</li> <li>26.8 27.9.2019</li> <li>Mo - Fr bis 19 Uhr, Sa bis 16 Uhr (nur 14. und 21.9.2019)</li> </ul> </li> </ul>
3	Parkplatzmarkierung -> Kick-off, MA wiss		
			<ul> <li>Markierungsarbeiten für ca. 185 Stellplätze am 13.05. durchgeführt.</li> <li>Aktueller Stand:</li> <li>Fehlende Markierungen (4 Plätze) in der Zufahrtsgasse wurden ergänzt + Randparkplätze zusätzlich seitlich schraffiert. Zukünftig werden in der Fahrgasse parkende PKW-Halter informiert, dass sie ggf. abgeschleppt werden.</li> </ul>
4	Besprechungsraum Bibliothekszen -> Runder Tisch 26.01.2018	trale ME 02/13	
			<ul> <li>Der Besprechungsraum wird rege genutzt.</li> <li>Buchung über VPIS möglich</li> <li>Die Heizleistung der Heizkörper wurde auf Wunsch verbessert.</li> </ul>

### r (Teil)Projekte

### Sanitäre Anlagen (H 521 – Mustermodernisierung)

-> Runder Tisch 26.01.2018

### vor Modernisierung:





nach Modernisierung:





- Grundausstattungskonzept festgelegt, soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden
- Fertigstellung H521: Dezember 2018
- Probleme mit neuem Seifenspender -> Einsatz eines anderen Modells, das bis dato. funktioniert, lt. Hersteller war der zuerst installierte eine Montagsmodell.

#### 02.07.2019: Feedback vom FB E&I (31 Unterschriften):

Maßnahme	Pro	Kontra	Kommentar
Beleuchtung	х		Sehr gut gelöst
Waschtisch		х	Tischplatte steht ständig unter Wasser
Spiegel	х		Beleuchtung vorhanden aber nicht angeschlossen
Seifenspender			Der zuletzt monierte Seifenspender ist in Ordnung. Der zuerst
		х	Montierte ist nicht tauglich, da ständig leer und ständig defekt.
Handtuchspender		х	Zu dünnes Papier, ständig leer. Funktioniert nicht einwandfrei.
Toilettenpapierhalter			
neben dem WC (nicht			Schlechte Position, da das Papier bei stehend Urinierenden mit
Spender)		x	Urin benetzt wird.
Sichtschutz Urinal	х		
Türschließer Zwischentür		х	Schlechte Luftzirkulation

**Hinweis**: Serviceanfragen und Störmeldungen an TBD Hagen

https://www4.fh-

swf.de/de/home/beschaeftigte/verwaltungunddezernat/
dezernat 7/stoerungen/index.php#

 An dem Ausstattungskonzept wird mit Ausnahme der Obentürschließer und Position der Reservehalter festgehalten, zumal bereits für alle sanitären Anlagen die Planungen abgeschlossen sind und die Ausschreibungen bzw. Beschaffungen laufen.

Nr	(Teil)Projekte		
9	Fahrradständer (Interimslösung) -> MA wiss, Runder Tisch 26.01.2018		
	Barrierefreiheit		<ul> <li>bewilligt durch Kanzler (Runder Tisch 28.01.2018)</li> <li>ggf. zukünftig abschließbare Fahrradbox-Lösung:         <a href="http://cyc-lok.ch/">http://cyc-lok.ch/</a></li> </ul>
	-> Fachschaften TBW und E+I, VP Sch	werbe., Beauftragte Stud.+ Beh.	
	Behindertengerechte Türen		<ul> <li>Sachstand:         <ul> <li>Foyer 1 &lt;-&gt; Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt</li> <li>Foyer 1 &lt;-&gt; Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt</li> <li>Foyer 2 &lt;-&gt; FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt</li> <li>Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt</li> </ul> </li> <li>im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich</li> <li>Weitere Maßnahmen nur bei konkretem Bedarf</li> </ul>

# 2. Bewilligte und priorisierte (Teil)Projekte

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
2	Schwarzes Loch inkl. Bibliotheks -> Kick-off	eingangsbereich und Zugang zu den Lernräumen	
2.1	Schwarzes Loch		<ul> <li>Schwarzes Loch: Erste Planungen von Frau Busse:         barrierefrei Lerninsel mit (Lounge)Sitzgelegenheiten</li> <li>Vorgestellte Planung OK und mit BLB abgestimmt.</li> <li>Aktueller Stand</li> <li>Grobkostenermittlung ist abgeschlossen</li> <li>BLB plant Sommer/Spätsommer mit Baubeginn. Geplante Fertigstellung: Ende 2019</li> <li>Anfang Juli 2019: Auftragsvergabe (BLB) an Planungsbüro</li> </ul>
2.2	Lichtgestaltung Schwarzes Loch	Entwürfe (Beispiele)	<ul> <li>Vorstellung der (Zwischen)Ergebnisse haben überzeugt und begeistert</li> <li>Ihre Projektarbeit zur Lichtgestaltung haben die Studierenden Held und Jung auf dem 6. Treffen Runder Tisch (8. Februar 2019) vorgestellt, Thema: Herz der Maschine. Der Entwurf hat viel Beifall erhalten und soll nun bis zur Ausführungsplanung weiter bearbeitet werden. Voraussichtliche Kosten ohne Installation: ca. 8.800 Euro</li> </ul>
5	Schallschutz + Gestaltung M-Han	lle (Lichthof)	
	-> Dieses Teilprojekt wird zukünf	tig unter 6. Lerninseln geführt	


Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
6	Lerninseln: Wo möglich? -> Runder Tisch 26.01.2018		
6.1	Umbau Werkstatt MU	MU 06  MU-06-Bestuhlung wie MU 12	<ul> <li>(Lernzentrum/ Lernwerkstatt) und zusätzlich Seminarraum in TBD-Büro</li> <li>Grundriss und Entwurf Frau Busse</li> <li>weiteres Vorgehen</li> <li>Rückbau bestehender Installationen</li> <li>Möblierung: ggf. Schreibtischstühle (starre Holzstühle) und Tische wie geplante Modernisierung H 206 in IS, Frauenstuhlweg (mit Stellvarianten)</li> <li>Aktueller Stand</li> <li>Vorläufige Planung vom BLB: Baubeginn voraussichtlich 2019, zusammen mit dem Schwarzen Loch</li> </ul>
6.2	Foyer 1 inkl. Eingangsbereich	Grundriss	<ul> <li>Renovierung, Um-/ Neumöblierung</li> <li>Foyer-Umgestaltung sollte in Verbindung mit dem Haupteingangsbereich (außen) stattfinden; ggf. in Verbindung mit Außentreppensanierung (BLB)</li> <li>Brandschutzkonzept BLB steht aus</li> </ul>

### (Teil)Projekte Sach- und Planungsstand Nr 6.3 Foyer 2 vor weiterer Planung/Umsetzung Errichtung einer Brandabschottung notwendig Brandschutzkonzept BLB steht aus Aktueller Stand: Die Nutzung der Schrankschließfächer hier und im Bibliothekseingangsbereich ist sehr gering. Über Frau Achtel Infomail an Studierende (13.05.2019), Aushangwird geprüft Bzgl. Schrankschließfächer: Klärungsbedarf besteht, ob und wo ggf. weitere Schließfächer (Größe?) in den Etagen 1 – 5 gewünscht werden. Türtaster haben Acrylschild erhalten, um die geklebten Hinweiszettel zu verhindern Weiteres Vorgehen: Nach Errichtung der Brandabschotttung (-> BLB): Neumöblierung Foyer 2, Beleuchtung / Beleuchtungskonzept für "Kunstwand".

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
6.4	Umgestaltung M-Halle (Lernzentrum/Verteilerflur) inkl. Schallschutz	Entwurf Neumöblierung  Grundriss und Bestuhlungsentwurf	<ul> <li>Um-/ Neu-Möblierung des Lichthofs (Lernzentrum), ggf. Schallschutzverbesserung</li> <li>Aktueller Stand</li> <li>1. Bestuhlungskonzept mit Akustikelementen liegt vor</li> <li>Vorbehalte der IT wg. Lärmbelästigung</li> <li>Die Kostenplanung für die Bestuhlung inkl. Akustikelemente hat der Kanzler bewilligt (16.07.2019).</li> <li>Weiteres Vorgehen</li> <li>Prüfung der Bestuhlungsanordnung (Fluchtwege!) durch Sachverständigenbüro</li> <li>Detailplanung und Beschaffung</li> <li>Beauftragung Maler</li> </ul>

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
6.5 <b>6.6</b>	Umwidmung Bibliothek Zeitschriftenmagazin (Projektabwicklung Bibliothek)  Neugestaltung Flure inkl. Flurnis	schen, Spinde und Beleuchtung	<ul> <li>Einrichtung von Lernnischen für Studierende</li> <li>(Aus)Sortierung des Magazins bis Ende 2018, Einrichtung als Lernnische im 1. Halbjahr 2019 mit ggf. moderaten Regeln bzgl. Essen und Trinken</li> </ul>
	-> Runder Tisch, MA wiss  EG-Hauptgebäude B1-Pinnwände, Wartezone(n) Studierendenservicebüro- Bereich (SSB), Lichtaspekte	Skizz dor Cytichkeit (Angiorinic corr)  Skizze dor Cytichkeit (Angiorinic corr)  Skizze dor Cytichkeit (Angiorinic corr)  Skizze dor Cytichkeit (Angiorinic corr)	<ul> <li>Umsetzung gemäß Entwurf.</li> <li>Die endgültige Belegung und Verortung der geplanten B1-Pinnwände und Einbauvitrinen wurde in Rücksprache mit Frau Kalovljevic und Frau Renz geklärt.</li> <li>Aktueller Stand:         <ul> <li>Kitchenette ist in der Beschaffung</li> <li>Pinnwände und Vitrinen sind beauftragt. Liefertermine werden aktuell geklärt</li> <li>Klappsitze: Liefertermin: 2.08.2019</li> <li>Kopiermöbel: Liefertermin KW 29/30</li> <li>Nischenschließung sind abgeschlossen</li> <li>Malerarbeiten: geplant: 31.0705.08.2019</li> </ul> </li> <li>Zentrale Wasserspender: Es liegen 2 Angebote von BRITA und WaterLogic vor. Aktuell gibt es aber keinen Standort, der von FaSi und Feuerwehr akzeptiert wird. Anfrage an Sachverständigenbüro bezüglich Standort läuft.</li> </ul> <li>Weiteres Vorgehen         <ul> <li>Klärung über Türinfos: ggf. Klapprahmen, Magnettafel, digitales Pad vs. Zettellage -&gt; einheitliche Erscheinung</li> <li>Sobald die Modernisierung des EG abgeschlossen ist, Info an alle, dass ab sofort Flyer, Zeitschriften u.ä. nur noch in den dafür vorgesehenen Prospektvitrinen ausgelegt werden darf.</li> </ul> </li>

Nr	(Teil)Projekte				Sach- und Planungsstand	
	Pinnwände / Vitrinen	/ Infoständer				
	-> FaSi, Brandschutz					
					<ul> <li>Finanzielle Mittel: 25.000 € (zentrale Mittel) plus ca.</li> </ul>	
	Bestand	offene Pinnwände 126	Glasvitrinen im Bestand 50	Prospektständer über 20	6500 € aus dem Provinzial-Budget	
	aktueller Bedarf	B1-Pinnwände	B1-Einbauglasvitrinen	B1-Prospektvitrinen + 1 Buchtauschregal	<ul> <li>Stand 26.07.2018: ca-Kosten in Höhe von 80.000 Euro</li> </ul>	
	Kostenschätzung	52 + 6 (TBW) pro Stück ca. 510 € 29.580 €	16 pro Stück ca. 1.900 € 30.400 €	6 pro Stück ca. 1.800 € / 1.900 € 10.800 €	<ul> <li>Aushang der amtl. Bekanntmachungen: Veröffentlichungen:</li> </ul>	ıg
		29.580 €	Kostenschätzung gesamt	70.880 €	zukünftig nur noch <mark>an einer Stelle</mark> (vgl. Grundordnung	
	bereits finanziert über		B1-Einbauglasvitrinen	B1-Prospektvitrinen	§20, Abs. 4) im Flur EG durch SG 7.2 in der Liegenschaft	.
	Modernisierungsbudget Hagen, Haldener Straße	11 (Flur EG) (4 zusätzliche für Foyer 2 und Bibliothekseingangsbereich, kleinere Formate, bleiben hier unberücksichtigt)	2	1 B1-Standvitrine (Buchtauschregal) 3 B1 – Standvitrinen (Prospekte) 1 B1 – Einbauvitrinen (Prospekte)	<ul> <li>Aktuelle Ausstattung ist ermittelt (inkl. MU, ME, Audimax, Lüdenscheid, Im Alten Holz)</li> <li>Frau Woelke hat für die zu ersetzenden Pinnwände und</li> </ul>	ı
	caKosten	5.610 € (1.650 €)	3.800 €	1.800 € 5.400 € 1.900 €	Einbauglasvitrinen eine aktuelle Kostenschätzung erstel	llt.
			bereits finanziert gesamt	18.510 €	<ul> <li>Der gemeldete Bedarf der FBs wurde in die Beschaffung</li> </ul>	3
	Topf Zentrale Mittel Provinzial Versicherung	zur Verfügung stehe	nde Mittel (zentral und Versicherung) gesamt	25.000 € ca. 6.500 € 31.500 €	gegeben. Die Finanzierung über den zur Verfügung stehenden Mitteln hinaus klären nach der Beschaffung	
			aktuell ausstehende Finanzierung gesamt	ca. 20.870 €	die Fachbereiche TBW und E+I untereinander.	
					<ul> <li>Aktueller Stand</li> <li>Das Angebot liegt vor. Die Kosten sind deutlich niedrige Kostenschätzung gesamt: 70.880 Euro Kosten Angebot gesamt: 47.270 Euro</li> <li>Liefertermin: ca. August 2019</li> <li>BT-30-Bohrungen können ab 10. Juli 2017 vom TBD vorgenommen werden.</li> <li>Weiteres Vorgehen</li> <li>Beschriftung der Pinnwände mit Magnetfolien. Frau Klovljevic und Frau Renz listen die benötigten Bezeichne auf.</li> </ul>	

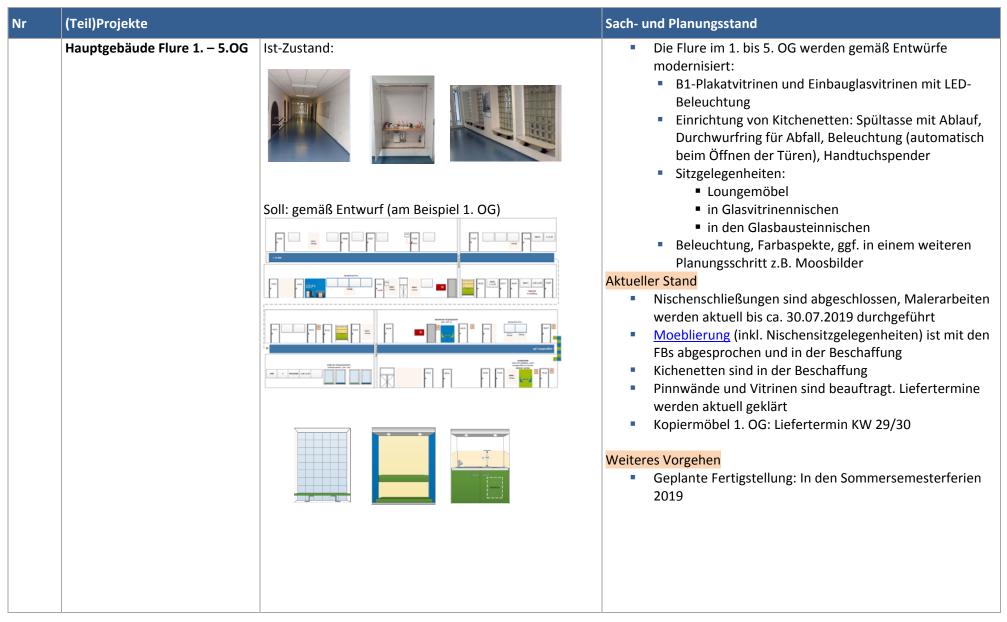

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand		
7	Sanitäre Anlagen -> Runder Tisch	h 26.01.2018			
	Sanitäre Anlagen EG, 1. – 4. OG	vor Modernisierung:  nach Modernisierung (am Beispiel H 521):	<ul> <li>Grundausstattungskonzept ist festgelegt (wie H 521), soll für die übrigen sanitären Anlagen übernommen werden</li> <li>Weiteres Vorgehen</li> <li>Modernisierung Damen- und Herren-WC im EG (HE 19 + HE 20)</li> <li>Sukzessive Modernisierung aller Damen-, Herren- und Behinderten-WCs in der Liegenschaft Hagen, Haldener Straße</li> <li>Bauzeitenplan</li> <li>Aktueller Stand</li> <li>Die Modernisierung der Sanitären Anlagen ist für den gesamten Standort bewilligt.</li> </ul>		
8	Bannerwerbung auf dem Grund -> Runder Tisch 26.01.2018	stück			
		Bannerwerbung (Bannermasten):  Videowall-Lösung	<ul> <li>Werbebanner ausdrücklich gewünscht: FBs und Fachschaftsvertreter; alternativer Standort: Hausfassade</li> <li>Stadt Hagen (Frau Leithaus) hat Einwände gegen Bannermasten, aber keine Einwände gegen Fassadenlösung (Videowall, siehe Bild links unten)</li> <li>Aktueller Stand</li> <li>Gerichtliche Auseinandersetzung am Standort Soest endete zu Ungunsten der Videowall. Das Gerichtsurteil ist für alle Standorte richtungsweisend.</li> </ul>		

Nr	(Teil)Projekte		Sach- und Planungsstand
11	Klimatisierung -> PRwiss, MAwiss,		
10	Klimatisierung der Besprechungsräume H104 + H 302  Innenhofgestaltung		<ul> <li>Dazu wird es eine technische Bewertung geben. Diese soll als Entscheidungsgrundlage dienen, ob eine Realisierung 2019 möglich ist.</li> <li>Aktueller Stand         <ul> <li>Stellungnahme des Kanzlers</li> </ul> </li> </ul>
	-> Kick-off Innenhofgestaltung: Snackpoint, Brunnen, (Schatten)Sitzgelegenheiten, Aufwertung Kunstwerk	Vorschlagsliste:  Mensatische im Innenhof Sitzgelegenheiten mit Tischen Versetzung des Kunstwerks (Grund: Verletzungsgefahr) Grillpavillon: http://ravigupta.info/grill-pavillon-holz/grillpavillon-holz-rund-individuelle-grill-pavillon-holz-grillpavillon-holz-rund-individuelle-grill-pavillon-holz-grillpavillon-holz-rund-individuelle-grill-pavillon-grill-pavillon-holz-rund-individuelle-grill-pavillon-grill-pavillon-holz-rund-individuelle-grill-pavillon-fuer-den-spielpatz-z1bz5444-1844-4001-961d-152a183e5713.html Schaukel für Große Barfußpfach https://www.aktion-orthofit.de/barfusspfad/ Raucherpavillon Sitzmöglichkeiten mit Tischen Sonnensegel Reaktivierung des Brunnens Relaxilegen Sitzgelegenheit mit Tischen unterschiedliche Ebenen (Podeste) seitliche Hochbeete mit Bepflanzung Pavillons Sonnensegel – mit Sichtschutzfunktion "Raucherecken" Sitzgruppen, auch mit Tischen Mülleimer Sonnensegel Sitzgelegenheiten mit Tischen	<ul> <li>Garten- und Landschaftsarchitekt für Planung + Durchführung erforderlich/wünschenswert</li> <li>Weiteres Vorgehen:         <ul> <li>Planung 2019 anstoßen, Realisierung ggf. Frühjahr 2020</li> <li>ggf. Beleuchtungskonzept (auch für Kunstwerk) durch FB-Projektgruppe Boeser</li> </ul> </li> <li>Aktueller Stand         <ul> <li>Vorschlagsliste der BedarfsträgerInnen (s. links) + Vorschlag von Frau Prof. Weichs: mobile Sitzgelegenheiten für kleinere Seminargruppe (12-15 Teilnehmer)</li> <li>Bewilligt ist zunächst die Beratung und Planung von einem GaLa-Architekturbüro:</li></ul></li></ul>

# 3. Vorschläge (Teil)Projekte

r Projekte	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sach- und Planungsstand
orschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBV	3: MATuV 4: MAwiss 5: MABibliothek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.
Einhausung Infoscreen - Eingangsbereich Bibliothek: (Brandschutz)	<ul> <li>Mit Beschaffung des Bibliothek-Infoscreens IS soll die Einhausung vorgenommen werden -&gt; Umsetzung steht in IS und HA aus</li> <li>Zuständig: Bibliothek</li> </ul>
Dusche für Studierende/MitarbeiterInnen	aktuell keine Räume vorhanden  Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich
. Barrierefreiheit	-> Thematiken zur Barrierefreiheit zusammengefasst Aktueller Stand (26.07.2018):  Lt. Kanzler gibt es keine gesetzliche Vorgaben für die Umsetzung der gewünschten Anpassungen. Daran orientieren sich auch Bauherren wie z.B. c BLB. Handlungsbedarf besteht zunächst nur bei akutem Bedarf. Bei einer Grundsanierung oder bei einem Neubau werden die Vorschläge neu bewerte
Behindertengerechte Türen im gesamten Gebäude	<ul> <li>Sachstand:         <ul> <li>Foyer 1 &lt;-&gt; Audimax: Stand 16.01.2018 erledigt</li> <li>Foyer 1 &lt;-&gt; Foyer 2: Stand 16.01.2018 erledigt</li> <li>Foyer 2 &lt;-&gt; FB-Sekretariate: Stand: 5.2.2018 erledigt</li> <li>Bibliothek: Stand: 5.2.2018 erledigt</li> <li>im gesamten Gebäude: Realisierung erst bei einer Grundsanierung möglich</li> </ul> </li> </ul>
Sprachcomputer in Aufzügen	x Installation bei Grundsanierung
Leitsystem für Schwerbehinderte	Fachberatung und -planung (Konzept) erforderlich  Installation bei Grundsanierung
Arbeitsplätze in Hörsälen, Laboren und Bibliothek, Lernräume (unterfahrbare und höhenverstellbare Tische /Arbeitsplätze); Labore: Sitzgelegenheiten (Ausruhen, Versuche absolvieren	<ul> <li>Frau Krause wird die Labore begehen und den Bedarf ermitteln, Feedback bis zum 12.07.2018, Vorstellung der Ergebnisse: 4. Treffen Runder Tisch (26.7.2018): Feedback von Frau Krause</li> <li>Bei Neuplanungen sollen zukünftig diese Aspekte berücksichtigt werden</li> </ul>
Ruheraum	Extra-Räume können aufgrund der Raumnot nicht zur Verfügung gestellt werden

Nr	Projekte	1	2	3	4	5 6	7	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorsch	Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW			υV	4: N	1Awi	ss	5:	MAI	Bibli	ioth	ek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.
												<ul> <li>Ggf. kann hierfür bei Bedarf der Multifunktionsraum genutzt werden</li> </ul>
4.	Gebäudeöffnungszeiten verlängern,											Die neue Hausordnung sieht das nicht vor
	insbes. vor Klausuren		X									<ul> <li>weitere Diskussion durch Kanzler angestoßen</li> </ul>
5.	Vorzeigeprojekt E+I und TBW											• Interesse?
												<ul> <li>Vorschläge bis zum nächsten 4. Treffen Runder Tisch: Keine Vorschläge vom FB TBW</li> </ul>
		x	х									Weiteres Vorgehen:
												<ul> <li>Vorschläge von Herrn Oehlenschläger für das Fachbereich E+I beim 5. Treffen</li> </ul>
												Runder Tisch am 25.10.2018 ?????????
6.	E-Tankstelle für private PKW											Sondierung Dez. 7
	(abrechenbar/buchbar)								2	х		<ul> <li>Alternative nach Werkstattumbau (Starkstromanschluss)</li> </ul>
												<ul> <li>Grundsatzentscheidung durch HS-Leitung erforderlich</li> </ul>

# 4. (Teil)Projekte, die nicht berücksichtigt werden

Nr	Projekte	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	Sach- und Planungsstand
Vorsc	Vorschlag von: 1: Runder Tisch 2: Fachschaft E+I TBW				MΑι	wiss	5:	: M.	ABib	lioth	ek 6: FB Projektgruppe 7: VP Schwerbeh. 8: FaSi 9: Dekan E+I 10: Beauftragte Stud.+ Beh.
1.	Foyer 1/2: Versorgungsautomaten Sandwich + Getränke		x								<ul> <li>abgelehnt wg. Brandlast und geplanter Serviceerweiterung der Mensa</li> </ul>
2.	Foyer 1/2: Umgestaltung (Sitzgelegenheiten/Lernzonen/Pflanze n)			x							-> wird im Kontext Schaffung von Lerninseln (siehe obe. <i>Priorisierte Projekte, Punkt 6.4</i> ) berücksichtigt, deshalb in Vorschlagsliste nicht mehr separat geführt
3.	Zusätzliche Steckdosen für Rechner der Studierenden in Seminarräume			x							-> erledigt, da technisch nicht möglich
4.	Multifunktionsraum für PR, ASTA, Fachschaft: Alternative f. Erste-Hilfe- Raum		x								<ul> <li>aktuell gibt es keine Ausweichmöglichkeiten</li> <li>ggf. Nebenraum Mensa oder Besprechungsraum nach Bedarf buchen?</li> <li>-&gt; erledigt, da keine Räume zur Verfügung stehen</li> </ul>
5.	Lärmschutz Feithstraße: Bäume/Hecken		×								<ul> <li>Bäume und Hecken sind aufgrund der Topografie wirkungslos;</li> <li>Lärmschutzwände sind nicht umsetzbar</li> </ul>
